

地域県土警察常任委員会資料

(令和7年4月21日)

■ 大山ーノ沢で発生した雪崩被害の対応について

【技術企画課・道路企画課】……2ページ

■ 中国横断自動車道岡山米子線(米子～境港)計画段階評価着手の決定について

【道路企画課】……3ページ

■ 令和7年度鳥取県水防訓練の実施について

【河川課】……4ページ

■ 境港昭和南地区岸壁整備の新規事業化について

【港湾課】……6ページ

■ 境港の特定利用港湾指定について

【港湾課】……7ページ

■ 第2回境漁港係留岸壁検討会の開催結果について

【港湾課】……8ページ

■ 3万トン級クルーズ客船の鳥取港への初寄港について

【港湾課】……9ページ

■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【技術企画課、道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、港湾課】……10ページ

県 土 整 備 部

大山一ノ沢で発生した雪崩被害の対応について

令和 7 年 4 月 21 日
技術企画課・道路企画課


3 月 10 日※に発生した大山一ノ沢での大規模な雪崩により被災した、主要地方道倉吉江府溝口線（冬季閉鎖中区間）にある「一の沢橋」への対応等を報告します。

※登山者からの情報による推定

1 被災状況及び対応状況等

（１）被災状況 [4/10 時点]

- ・一ノ沢上流の標高約 1,500m を発生源として雪崩が発生し、距離 1,600m、標高差約 600m を流れ下り、推定厚さ 7 m の雪崩先端が橋梁に衝突したものと推定される。
- ・この雪崩により「一の沢橋」の橋桁（橋長 40.9 m、重量約 920 t）の左岸側が 125 c m 程度下流に滑動している（当橋梁の通行は不能）。

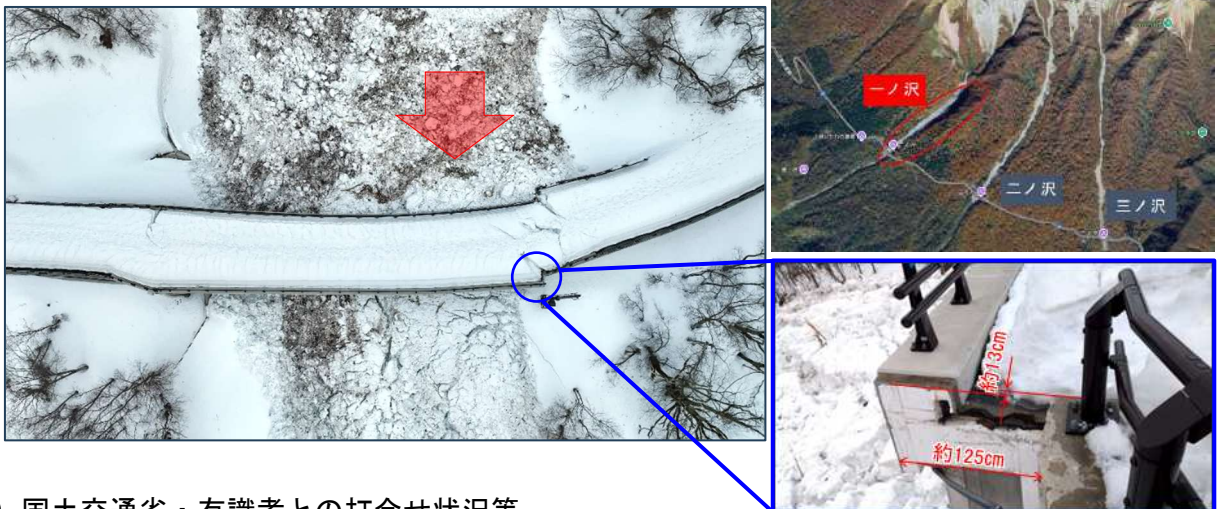

（２）国土交通省・有識者との打合せ状況等

- 3 月 18 日 国土交通省防災課：災害復旧事業の対応を協議
- 25 日 新潟大学 河島教授、松元特任准教授：県との包括協定を活用し、雪崩の現地調査や解析方法を相談
- 4 月 4 日 鳥取森林管理署：国有林内の復旧等について協議、調整
- 6 日 平井知事による現地視察

（３）復旧方針及びスケジュール

- ・災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業 橋梁災）を申請予定
- ・今後、詳細な測量調査、設計を実施し、関係機関（国交省、林野庁、環境省）と協議を進めながら秋頃を目途に災害査定を行う予定であり、令和 10 年度の復旧を目指す。

2 当面の対応について

（１）迂回路の設置

- ・旧道（一の沢橋を設置する前のルート）を迂回路とするよう関係機関等と調整中
- ・迂回路へ土砂流出する危険があるため、有識者の相談を踏まえて、雨量計や監視カメラ設置等による安全対策や雨量等の通行規制基準を設定したうえで交通開放を行う。
- ・梅雨明け（夏の観光シーズン前）までの迂回路開放を目指す。

（２）通行止めの案内

- ・迂回路開放までの間、通行止め情報や代替ルートをホームページや看板等で周知する。



↑旧道（交通開放時は舗装を行う）

中国横断自動車道 岡山米子線(米子～境港) 計画段階評価着手の決定について

令和 7 年 4 月 21 日
道 路 企 画 課


令和 7 年度国土交通省関係予算において、長年の悲願であった米子・境港間の高規格道路の計画段階評価着手が決定しました。

県としても、今後円滑な事業推進が図られるよう、関係機関と連携し地元として全面的に協力していきます。

1 計画段階評価とは

「計画段階評価」とは、地域住民や道路利用者の意見を聴きながら、現在の道路における解決すべき課題の把握や原因を分析し、道路を建設する上での目標を明確化します。


そして、その目的を達成するためにはどのような道路が最適なのか、複数の概略ルートと比較・評価した上で対応方針案（最適な概略ルート）を決定します。

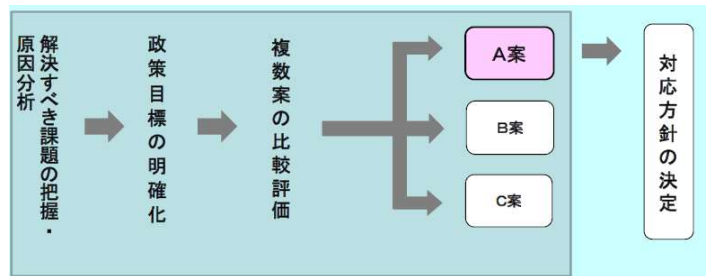

2 新規事業化までの流れ

社会資本整備審議会道路分科会中国地方小委員会において計画段階評価の対応方針案が妥当と判断されれば、詳細ルートや構造の検討を行った上で環境アセスメントや都市計画決定手続きを行います。

それらが完了すれば、新規採択時評価に移行し、社会資本整備審議会道路分科会中国地方小委員会及び事業評価部会において事業化が妥当と判断されれば新規事業化となります。

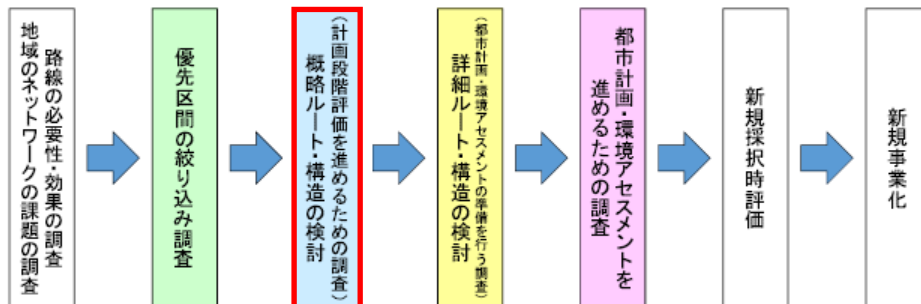

3 これまでの主な経緯

- ・平成 18 年 2 月 事業凍結（米子 IC～米子北 IC 間）
- ・平成 24～27 年度 「米子・境港地域と道路のあり方勉強会」
- ・平成 27 年度 「中国横断自動車道岡山米子線 4 車線化促進鳥取県議会議員連盟」発足
→令和 2 年度「中国横断自動車道岡山米子線(蒜山 IC～境港間)鳥取県議会議員連盟」に名称変更
- ・平成 27～令和元年度 「米子・境港地域と道路のあり方検討会」
- ・令和元年 11 月 初めて知事・2 市 1 村長で国へ要望を実施
- ・令和 2 年度 「中海・宍道湖圏域道路整備勉強会」
- ・令和 3 年度 「米子・境港間の高規格道路 地元懇談会」
- ・令和 5 年 8 月 「中海・宍道湖 8 の字ルート整備推進会議」発足
- ・令和 5～6 年度 「米子・境港地域 道路整備勉強会」
- ・令和 6 年 12 月 「社会資本整備審議会 道路分科会 中国地方小委員会」
- ・令和 7 年 3 月 中海・宍道湖 8 の字ルート整備促進に係る国要望を実施

令和7年度鳥取県水防訓練の実施について

令和7年4月21日
河 川 課

出水期を前に、河川における洪水を想定した水防訓練を実施します。

1 目 的

出水期に備えて、市町村（水防管理団体）を始めとする関係機関及び地域住民等の参加のもと、河川における洪水や土砂災害を想定した各種訓練を実施し、関係機関の意識高揚や県民への意識啓発などを図ります。

2 開催日時

令和7年5月18日（日）
午前9時～11時30分（小雨決行）

3 場 所

千代川右岸河川敷（鳥取市西品治）
にしほんじ

4 日 程

- (1) 開会（午前9時）
 - ・水防本部長（知事）挨拶
 - ・来賓挨拶
- (2) 訓練（午前9時20分～11時20分）
 - ・水防工法訓練、避難訓練、人命救助訓練、情報伝達訓練 等
 - ・災害時要配慮者避難訓練
- (3) 閉会（午前11時25分）
 - ・講評（県土整備部長）

5 主 催 鳥 取 県

6 参加団体（予定）

鳥取県警察本部、鳥取警察署、中国管区警察局鳥取県情報通信部、陸上自衛隊第8普通科連隊、国土交通省鳥取河川国道事務所、鳥取県東部広域行政管理組合消防局、鳥取市消防団、岩美町消防団、八頭町消防団、智頭町消防団、若桜町消防団、鳥取県東部建設業協会、鳥取大学地域安全工学センター、鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町、わかさ・あすなろ（要配慮者施設）、鳥取県水防本部（河川課）、鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所

7 そ の 他

鳥取市・千代川での開催は、令和元年度以来6年ぶりです。

【水防訓練会場位置図】



鳥取県水防訓練



ヘリを使用した孤立者救助訓練



土砂災害救出訓練



水防工法訓練

令和7年

9:00~11:30

5月18日(日)

小雨決行

見学自由

手話通訳あり

駐車場あり

会場：鳥取市西品治(千代川右岸河川敷：千代橋下流)

会場では、手話通訳付き
中継映像や、専門家による
音声放送により、緊迫した
訓練の様子を分かりやすく
解説。

災害時に役立つ「ロープワ
ーク」、「土のう作り」も体
験できます。

※詳しくはコチラ



水防団員 募集中!

水害を未然に防止し、被害を最小限に食い止め、私たちの生命や財産を守るため
貴重な役割を果たすのが **水防(消防)団** です。
一人ひとりが力を合わせてこそ水防は成り立つのです。現在、水防(消防)団員は、
減少、高齢化が進んでおり、水防活動の充実を図るためにも是非ともあなたの力が必要なのです。
水防(消防)団員は、非常勤の公務員という身分を有しており、市町村等で手当て等が支給されます。
詳しく知りたい方は居住する市町村等にお問い合わせください。



境港昭和南地区岸壁整備の新規事業化について

令和7年4月21日

港 湾 課

境港昭和南地区岸壁整備が直轄事業として新規採択され、令和7年度当初予算が計上されました。

1 事業概要等

- (1) 事業名：境港ふ頭再編改良事業
- (2) 事業目的：地域の経済活動を支える安定的な輸送網の構築、サプライチェーンの強靱化、大型船舶による輸送効率化を図るため、国際コンテナターミナルを整備する。
- (3) 事業効果：取扱貨物量の増大や大型船舶による輸送の効率化
定期コンテナ便の定時性向上
- (4) 整備内容：岸壁（水深12m）（耐震）、泊地（水深12m）、ふ頭用地
- (5) 事業期間：令和7年度～令和10年代半ば
- (6) 総事業費：202億円（うち港湾整備事業費172億円）
※ 202億円のうち30億円は境港管理組合が実施する起債事業等（ふ頭用地）

2 令和7年度事業内容

- (1) 実施内容：岸壁整備（水深12m）（耐震）に係る既存施設の撤去工
- (2) 事業費：当初予算5.0億円



画像 ©2025 Airbus、CNES / Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2025 200 m

境港の特定利用港湾指定について

令和7年4月21日

港 湾 課

総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議（第8回）が令和7年4月1日に開催され、境港が特定利用港湾に指定されました。


<全国の特定利用空港・港湾の指定状況>

新たに3空港及び5港湾が追加され、現時点で14道県の11空港・25港湾が指定されている。

特定利用空港：11空港

特定利用港湾：25港湾

（令和7年4月1日時点）

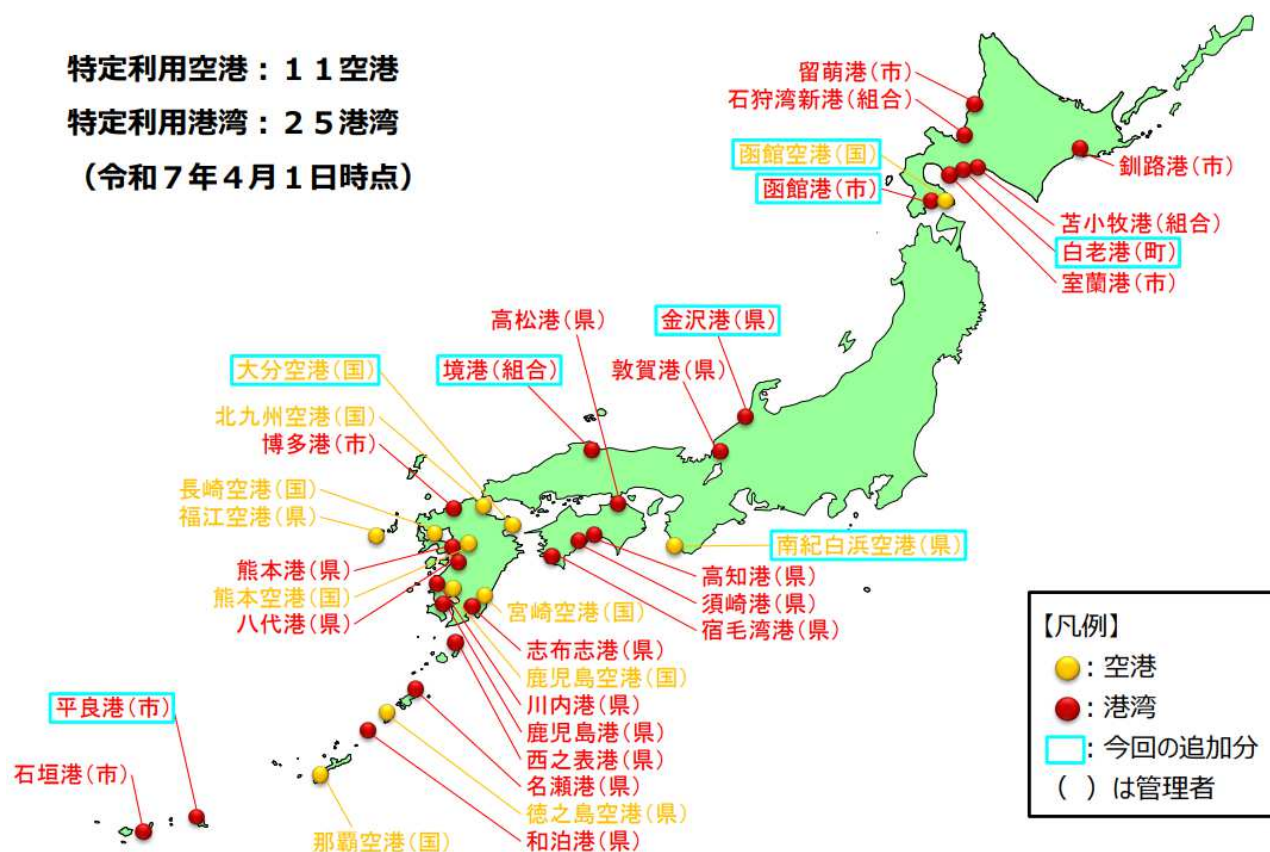

出典：内閣官房ホームページ

※「特定利用空港・港湾」においては、「民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう必要な整備を行うことに加え、既存事業を促進することによって利便性の向上や機能強化を図る」とされている。

第2回境漁港係留岸壁検討会の開催結果について

令和7年4月21日
港 湾 課

境漁港の係留岸壁不足解消のため、岸壁の周辺施設を含めた将来の対策を検討する第2回有識者検討会を開催しました。

1 開催結果

(1) 日 時 令和7年3月24日(月) 午前9時00分から午前9時45分

(2) 場 所 オンライン会議

(3) 構成員 国立大学法人東京海洋大学 客員教授 佐藤昭人
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 次長 後藤卓治
境港水産物市場管理株式会社 専務取締役 北野茂樹

(4) 概 要


- ・境漁港の係留岸壁整備の事業化に向けた今後の進め方について意見交換を行った。

(5) 主な意見

- ・将来的に漁獲量の増大を図っていくためには、岸壁を出漁準備から休憩まで、より稼働的に利用していくことが重要である。
- ・事業化に向けて、境漁港全体の将来的な展望の中で、短期的かつ集中的に本事業を実施していくという方向性が良い。
- ・費用対効果の便益は、イカ釣り漁船等の水揚げがなくても、補給や緊急避難などの岸壁利用に係る効果が得られるということをうまく盛り込む必要がある。

2 今後の進め方

- ・令和7年度に、概略検討、費用対効果の算定を行う中で、引き続き本委員へ意見聴取し、早期事業化に向けて国と調整を進めていく。

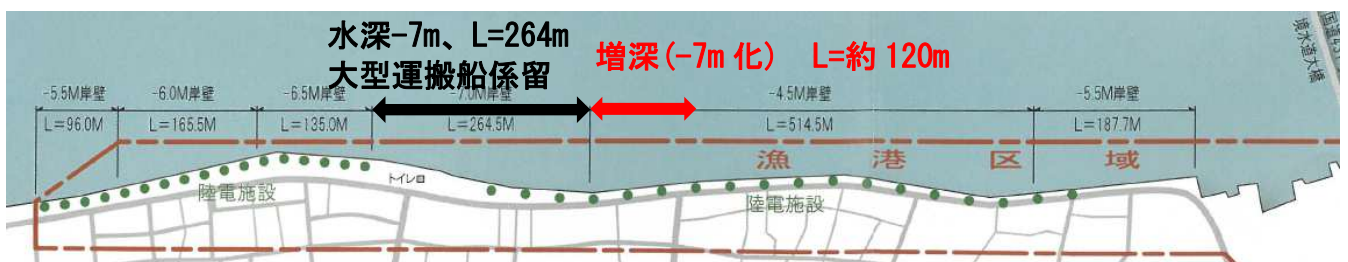

3 万トン級クルーズ客船の鳥取港への初寄港について

令和7年4月21日
港 湾 課

令和7年11月13日に商船三井クルーズ（株）が運航する三井・オーシャン・フジが鳥取港に初寄港します。

松葉ガニ漁の解禁直後の寄港となりますので、山陰の冬の味覚と観光を堪能できるクルーズとなります。

1 寄港日時

- ・ 令和7年11月13日（木） 午前8時 入港 午後4時 出航
※旅程は11/11 博多→11/12 隠岐→11/13 鳥取→11/14 釜山→11/15 博多となっています。
- ※令和7年7月30日（水）には境港への寄港が予定されています。

2 寄港船の諸元

- ・ 名称：三井・オーシャン・フジ
- ・ 諸元：総トン数 32,477 トン、全長 198.15m、全幅 25.6m
客室 229 部屋（全室スイート）、乗客定員 458 人
※総トン数、全長ともにこれまでに鳥取港に寄港したクルーズ客船の中で最大となります。



3 令和7年鳥取港寄港予定（3回）

日 付	船 名	備 考
6 月 1 日（日）	ル・ソレアル	3 年連続寄港
6 月 20 日（金）	につぼん丸	2 年ぶり寄港
11 月 13 日（木）	三井・オーシャン・フジ	初寄港

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	入札方式
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	大石川砂防災害復旧工事(R5年災326号(7～8工区))	鳥取市 国府町 大石	福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平	171,160,000円 (予定価格) 186,991,200円	令和7年3月3日 ～ 令和8年1月5日	令和7年3月3日	制限付 一般競争入札 (7社)
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道三朝中線道路災害復旧工事(5年災425号)	東伯郡 三朝町 神倉	県道三朝中線道路災害復旧工事(5年災425号)井中組・山根特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	294,580,000円 (予定価格) 300,699,300円	令和7年3月25日 ～ 令和8年3月5日	令和7年3月24日	制限付 一般競争入札 (1社)
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(古海1号橋)橋梁補修工事(2工区)(補助橋補修)(国補正)	鳥取市 古海	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	140,800,000円 (予定価格) 152,585,400円	令和7年3月14日 ～ 令和7年12月25日	令和7年3月14日	制限付 一般競争入札 (14社)
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(13工区)(補助)(国補正)	東伯郡 北栄町 江北	エスエー塗装工業株式会社 代表取締役 阪本 阿羅志	138,820,000円 (予定価格) 152,149,800円	令和7年3月31日 ～ 令和8年3月13日	令和7年3月31日	制限付 一般競争入札 (2社)
道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	県道倉吉江府溝口線(二ノ沢)改良工事(4工区)(防災安全交付金)(ゼロ県債)	日野郡 江府町 吉原	有限会社住田組 代表取締役 住田 孝昭	106,150,000円 (予定価格) 115,442,800円	令和7年3月14日 ～ 令和7年11月28日	令和7年3月13日	制限付 一般競争入札 (10社)
道路企画課 〔西部総合事務所 日野県土整備局〕	国道183号(新屋工区)歩道設置工事(2工区)(交付金交安)(国補正)	日野郡 日南町 新屋	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	109,120,000円 (予定価格) 118,592,100円	令和7年3月21日 ～ 令和7年12月15日	令和7年3月21日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	入札方式
道路建設課 〔八頭県土整備事務所〕	県道麻生国府線(福地工区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正)	八頭郡 八頭町 福地	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	92,840,000円 (予定価格) 100,987,700円	令和7年3月24日 ～ 令和7年12月3日	令和7年3月24日	制限付 一般競争入札 (3社)
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(倉吉関金道路)改良工事(石塚工区外)(52工区)(補助改良)(国補正)	倉吉市 石塚外	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	105,600,000円 (予定価格) 114,529,800円	令和7年4月15日 ～ 令和7年12月15日	令和7年3月24日	制限付 一般競争入札 (5社)
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(7工区)(補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社高野組 代表取締役 高力 久美	171,600,000円 (予定価格) 186,107,900円	令和7年3月31日 ～ 令和8年1月28日	令和7年3月31日	制限付 一般競争入札 (7社)
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(8工区)(補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 田後	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	121,000,000円 (予定価格) 131,698,600円	令和7年4月15日 ～ 令和8年1月15日	令和7年3月24日	制限付 一般競争入札 (6社)
道路建設課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	街路両三柳中央線改良工事(18工区)(補助)(国補正)	米子市 両三柳	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	180,400,000円 (予定価格) 195,773,600円	令和7年3月10日 ～ 令和8年1月9日	令和7年3月7日	制限付 一般競争入札 (4社)
治山砂防課 〔鳥取県土整備事務所〕	見生寺谷川砂防工事(堰堤工)(2工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 紙屋	大和建设株式会社 取締役社長 影井 一清	121,990,000円 (予定価格) 132,961,400円	令和7年3月31日 ～ 令和8年1月5日	令和7年3月28日	制限付 一般競争入札 (9社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	入札方式
治山砂防課 〔八頭県土整備事務所〕	ツツミ谷川通常砂防工事 (補助)(国補正)	八頭郡 八頭町 岩淵	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	117,700,000円 (予定価格) 125,830,100円	令和7年4月28日 ～ 令和8年1月19日	令和7年3月15日	制限付 一般競争入札 (5社)
治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	横手2地区復旧治山工事 (3工区)(国補正)	東伯郡 三朝町 横手	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	142,780,000円 (予定価格) 153,490,700円	令和7年4月1日 ～ 令和8年1月9日	令和7年3月7日	制限付 一般競争入札 (5社)
治山砂防課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	奥山川砂防堰堤工事(3 工区)(交付金)(国補正)	西伯郡 伯耆町 根雨原	株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	127,270,000円 (予定価格) 138,651,700円	令和7年3月6日 ～ 令和7年12月5日	令和7年3月5日	制限付 一般競争入札 (7社)
治山砂防課 〔西部総合事務所 日野県土整備局〕	荒田川砂防堰堤工事(堰 堤工)	日野郡 江府町 荒田	株式会社コーセン 代表取締役 川端 登志一	109,340,000円 (予定価格) 118,797,800円	令和7年3月6日 ～ 令和7年11月28日	令和7年3月6日	制限付 一般競争入札 (4社)
港湾課 〔鳥取港湾事務所〕	網代漁港機能保全外工 事(国補正)	岩美郡 岩美町 大谷外	YAHATA株式会社 代表取締役 中山 忠雄	115,170,000円 (予定価格) 125,620,000円	令和7年3月13日 ～ 令和7年10月6日	令和7年3月12日	制限付 一般競争入札 (1社)
港湾課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	泊漁港機能保全工事(第 3西防波堤)(3工区)(国 補正)外	東伯郡 湯梨浜町 泊	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	125,400,000円 (予定価格) 130,867,000円	令和7年4月1日 ～ 令和7年11月5日	令和7年3月14日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災141号)	鳥取市 佐治町 古市 ～ 刈地	YAHATA株式会社 代表取締役 中山 忠雄	(当初契約額) 179,850,000円	令和6年3月25日 ～ 令和6年12月20日	(当初契約年月日) 令和6年3月25日	-
					(変更後工期) 令和7年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和6年11月28日	工事中進入路の設置位置について、地元農道管理者との調整の結果、工事中進入路の位置変更が必要となったことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年9月30日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月24日	関連工事との工程調整による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災148号)	鳥取市 佐治町 古市	有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄	(当初契約額) 174,350,000円	令和6年9月10日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月10日	-
					(変更後工期) 令和7年11月28日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	資材の確保に時間を要したことによる工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	春谷川砂防災害復旧工事(R5年災335号、336号及び337号)	鳥取市 佐治町 春谷	北村屋木材株式会社 代表取締役 有田 繁博	(当初契約額) 143,990,000円	令和6年9月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月9日	-
					(変更後工期) 令和7年6月10日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	資材の確保に時間を要したことによる工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川外災害復旧工事(R5年災133号、134号、138号及び380号)	鳥取市 佐治町 加茂外	株式会社トラスト 代表取締役 倉持 崇広	(当初契約額) 110,770,000円	令和6年9月27日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月27日	-
				(第1回変更後契約額) 131,003,400円 (変更額) 〔20,233,400円〕	(変更後工期) 令和7年7月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月12日	不落となった道路災害箇所を早期復旧するため、本工事に追加したことによる工事費の増及び工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川外災害復旧工事(R5年災143号及び381号)	鳥取市 佐治町 余戸	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	(当初契約額) 111,980,000円	令和6年10月30日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年10月30日	-
					(変更後工期) 令和7年8月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	関連工事との工程調整による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	荒舟川砂防災害復旧工事(R5年災324号(1工区))	鳥取市 国府町 荒舟	株式会社創美 代表取締役 田村 徹	(当初契約額) 89,540,000円	令和6年3月8日 ～ 令和6年11月11日	(当初契約年月日) 令和6年3月8日	-
				(第1回変更後契約額) 109,931,800円 (変更額) 〔20,391,800円〕	(変更後工期) 令和7年3月17日	(第1回変更契約年月日) 令和6年10月17日	・測量作業の効率化を図るため、ICT測量の採用による工事費の増 ・関係機関(水道)との調整に時間を要したことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年3月27日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月17日	転石の処理に不測の日数を要したことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 126,402,100円 (変更額) 〔16,470,300円〕		(第3回変更契約年月日) 令和7年3月26日	床掘掘削時に想定以上の転石が発生したことによる工事費の増
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	国道482号道路外災害復旧工事(R5年災149号及び373号)	鳥取市 佐治町 森坪	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	(当初契約額) 164,890,000円	令和6年5月22日 ～ 令和7年2月12日	(当初契約年月日) 令和6年5月22日	-
					(変更後工期) 令和7年3月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年2月12日	関連工事との工程調整による工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月18日	関連工事との工程調整による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	国道482号道路外災害復旧工事(R5年災210号、378号、単災6号及び18号)	鳥取市 佐治町 福園外	美穂建設株式会社 代表取締役 田中 直樹	(当初契約額) 126,060,000円	令和6年5月29日 ～ 令和7年2月6日	(当初契約年月日) 令和6年5月29日	-
					(変更後工期) 令和7年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和7年2月5日	関連工事との工程調整による工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 126,866,300円 (変更額) 806,300円	(変更後工期) 令和7年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月24日	・工事数量精査による工事費の増 ・関連工事との工程調整による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	神馬川外砂防災害復旧工事(R5年災64号、65号、296号、297号及び298号)	鳥取市 河原町 神馬外	株式会社懸樋工務店 代表取締役 懸樋 義樹	(当初契約額) 122,650,000円	令和6年7月29日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年7月29日	-
					(変更後工期) 令和7年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	現地着手後、想定していた地山土質の変更に伴い、計画を変更する必要が生じたことによる工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	神馬川砂防災害復旧工事(R5年災322号及び323号)	鳥取市 河原町 神馬	株式会社トラスト 代表取締役 倉持 崇広	(当初契約額) 142,297,100円	令和6年8月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月9日	-
					(変更後工期) 令和8年3月16日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	地元調整の結果、工事用道路の計画を変更する必要が生じたことによる工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道小河内加茂線道路災害復旧工事(R5年災352号及び353号)	鳥取市 佐治町 津無外	株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文	(当初契約額) 104,390,000円	令和6年7月12日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年7月12日	-
					(変更後工期) 令和7年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	施工時に発生した法面崩落に対応するため、計画変更が必要となったことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	曳田川河川災害復旧工 事(R5年災46号外)	鳥取市 河原町 北村外	北村屋木材株式会社 代表取締役 有田 繁博	(当初契約額) 143,990,000円	令和6年8月28日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月28日	-
					(変更後工期) 令和7年7月10日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	工食用道路の盛土材(他工事発 生土)受入時期の工程調整によ る工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	曳田川河川災害復旧工 事(R5年災43号(3工区))	鳥取市 河原町 北村	有限会社プロテクト 代表取締役 岸野 忍	(当初契約額) 134,200,000円	令和6年8月26日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月26日	-
					(変更後工期) 令和7年7月18日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	コンクリートブロック資材不足に 伴い、納入時期が遅延したこと による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	曳田川河川災害復旧工 事(R5年災43号(1工 区))	鳥取市 河原町 北村	有限会社プロジェクト 代表取締役 岡田 竜美	(当初契約額) 100,100,000円	令和6年1月10日 ～ 令和6年9月12日	(当初契約年月日) 令和6年1月10日	-
					(変更後工期) 令和6年12月11日	(第1回変更契約年月日) 令和6年9月10日	近接工事との工程調整に係る遅 延による工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年3月14日	(第2回変更契約年月日) 令和6年12月4日	大型ブロック資材の納入遅延に 伴い、護岸工の着手時期が遅 延したことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 115,709,000円 (変更額) 〔15,609,000円〕	(変更後工期) 令和7年3月21日	(第3回変更契約年月日) 令和7年3月11日	・コンクリートブロックを大型ブ ロックに変更したこと等による工 事費の増 ・農道管理者との現地確認に係 る日程調整に時間を要したこと による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	佐治川河川外災害復旧 工事(R5年災136号及び 394号)	鳥取市 佐治町 加瀬木外	株式会社原田建設 代表取締役 原田 實	(当初契約額) 102,520,000円	令和6年7月10日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年7月10日	-
					(変更後工期) 令和7年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	関連工事との工程調整による工 期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災143号)	鳥取市 佐治町 余戸	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	(当初契約額) 124,410,000円	令和6年8月30日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月30日	-
					(変更後工期) 令和7年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	関連工事との工程調整による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災151号)	鳥取市 用瀬町 別府	株式会社ジューケン 代表取締役 加藤 辰宏	(当初契約額) 106,260,000円	令和6年7月3日 ～ 令和7年3月10日	(当初契約年月日) 令和6年7月3日	-
				(第1回変更後契約額) 125,849,900円 (変更額) 〔 19,589,900円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年1月10日	工事間調整の結果、工事用道路の盛土材を本工事で運搬したこと等による工事費の増
				(第2回変更後契約額) 131,662,300円 (変更額) 〔 5,812,400円 〕	(変更後工期) 令和7年4月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月7日	・土砂の搬出先の変更等による工事費の増 ・残土搬出先との調整による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災211号)	鳥取市 佐治町 古市	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	(当初契約額) 140,140,000円	令和6年6月20日 ～ 令和7年3月6日	(当初契約年月日) 令和6年6月20日	-
				(第1回変更後契約額) 172,827,600円 (変更額) 〔 32,687,600円 〕	(変更後工期) 令和7年3月21日	(第1回変更契約年月日) 令和6年12月25日	・起工測量結果による、河川中州部の堆積土砂掘削量の増による工事費の増 ・上記工事を追加したことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年4月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月19日	関連工事との工程調整による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔 鳥取県土 整備事務所 〕	大石川砂防災害復旧工 事(R5年災326号(1～6 工区))	鳥取市 国府町 大石	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	(当初契約額) 106,810,000円	令和6年3月28日 ～ 令和6年12月16日	(当初契約年月日) 令和6年3月28日	-
				(第1回変更後契約額) 139,637,300円 (変更額) 〔 32,827,300円 〕	(変更後工期) 令和7年3月14日	(第1回変更契約年月日) 令和6年12月6日	・工事の支障となる河床の転石 を破碎したこと等による工事費 の増 ・転石破碎等作業が追加となっ たことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 139,516,300円 (変更額) 〔 △121,000円 〕	(変更後工期) 令和7年3月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月13日	・工事数量精査による工事費の 減 ・河川内締切と集落の融雪施設 の取水位置が重複するため、調 整が必要となったことによる工 期の延伸
技術企画課 〔 八頭県土 整備事務所 〕	県道岩美八東線道路災 害復旧工事(5年災411 号)(その1)	八頭郡 八頭町 姫路	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	(当初契約額) 105,820,000円	令和6年3月25日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年3月25日	-
					(変更後工期) 令和7年6月18日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月10日	関連工事との工程調整による工 期の延伸
技術企画課 〔 八頭県土 整備事務所 〕	私都川河川災害復旧工 事(5年災250号、252号 及び253号)	八頭郡 八頭町 姫路外	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 129,910,000円	令和6年6月24日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年6月24日	-
					(変更後工期) 令和7年11月28日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月12日	資材・作業人員確保に不測の日 数を要したことによる工期の延 伸
技術企画課 〔 八頭県土 整備事務所 〕	私都川外河川災害復旧 外工事(5年災239号、 240号、344号、406号及 び単独46号)	八頭郡 八頭町 野町外	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 114,180,000円	令和6年3月11日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年3月11日	-
				(第1回変更後契約額) 116,018,100円 (変更額) 〔 1,838,100円 〕	(変更後工期) 令和7年6月16日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	・間知ブロックを大型ブロックに 変更したことによる工事費の増 ・資材・作業人員確保に不測の 日数を要したことによる工期の 延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔八頭県土整備事務所〕	私都川河川災害復旧工事(5年災245号)	八頭郡 八頭町 落岩	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 163,900,000円	令和6年3月13日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年3月13日	-
				(第1回変更後契約額) 164,609,500円 (変更額) 〔709,500円〕	(変更後工期) 令和7年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	・受注者の希望によりICT(三次元測量・データ)活用工事に変更したことによる工事費の増 ・資材・作業人員確保難に不測の日数を要したことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年5月30日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月24日	融雪による水位上昇により河川内作業を一時見送ったことによる工期の延伸
技術企画課 〔八頭県土整備事務所〕	県道岩美八東線道路災害復旧工事(5年災407号及び408号)	八頭郡 八頭町 落岩	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 122,870,000円	令和6年6月18日 ～ 令和7年2月25日	(当初契約年月日) 令和6年6月18日	-
					(変更後工期) 令和7年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和7年2月25日	工事用進入路が他工事と重複し、調整を行ったことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年8月22日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月25日	融雪による水位上昇により河川内作業を一時見送ったことによる工期の延伸
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号道路災害復旧工事(5年災418号)	倉吉市 円谷町	国道179号道路災害復旧工事(5年災418号)井中組・山根特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 271,700,000円	令和6年7月12日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年7月11日	-
				(第1回変更後契約額) 273,012,300円 (変更額) 〔1,312,300円〕	(変更後工期) 令和7年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月3日	・現道部の崩落防止のため、モルタル吹付による法面保護を追加したことによる工事費の増 ・大型ブロックの工場製作に時間を要したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	加茂川河川災害復旧工 事(5年災293号)	東伯郡 三朝町 福田	株式会社晃進 代表取締役 中口 雄志郎	(当初契約額) 168,300,000円	令和6年8月20日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月20日	-
					(変更後工期) 令和7年9月1日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	三朝町教育委員会との協議の 結果、着手前にオオサンショウ ウオ生息調査が必要となったこ と等による工期の延伸
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号道路災害復旧 工事(5年災423号)	東伯郡 三朝町 曹源寺	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	(当初契約額) 131,450,000円	令和6年8月2日 ～ 令和7年3月21日	(当初契約年月日) 令和6年8月1日	-
					(変更後工期) 令和7年6月10日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	施工方法等について漁協との協 議に時間を要したことによる工 期の延伸
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	加谷川河川災害復旧工 事(5年災288号)	東伯郡 三朝町 穴鴨	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	(当初契約額) 104,830,000円	令和6年2月26日 ～ 令和6年11月1日	(当初契約年月日) 令和6年2月26日	-
					(変更後工期) 令和7年3月14日	(第1回変更契約年月日) 令和6年10月16日	出水期期間の工事を中止したこ とによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年7月31日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月12日	本工事に隣接する三朝町発注 の災害復旧工事及び橋梁補修 工事との工程調整の結果による 工期の延伸
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	天神川河川災害復旧工 事(5年災283号)	東伯郡 三朝町 赤松	株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央	(当初契約額) 96,800,000円	令和6年10月8日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年10月8日	-
					(変更後工期) 令和7年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	施工計画(復旧工事施工時の瀬 替え)について、天神川漁協及 び地元との協議・調整に時間を 要したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	天神川河川災害復旧工 事(5年災285号)	東伯郡 三朝町 助谷	株式会社クラエー 代表取締役 西村 博文	(当初契約額) 100,320,000円	令和6年1月26日 ～ 令和6年9月27日	(当初契約年月日) 令和6年1月26日	-
				(第1回変更後契約額) 104,724,400円 (変更額) 〔 4,404,400円 〕	(変更後工期) 令和7年3月31日	(第1回変更契約年月日) 令和6年9月26日	・伐木量が当初想定より増えた ことによる工事費の増 ・伐木量が増えたこと及び出水 期間の工事を中止したことによ る工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年7月31日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月28日	護岸工の床掘において土質が 土砂から軟岩に変化したため、 床掘作業に時間を要したことによ る工期の延伸
道路企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	県道八日市釜口線(八日 市橋)耐震補強工事(2工 区)(補助橋補修)	鳥取市 河原町 八日市	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	(当初契約額) 104,170,000円	令和6年9月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月9日	-
				(第1回変更後契約額) 104,544,000円 (変更額) 〔 374,000円 〕	(変更後工期) 令和7年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月7日	・工事用道路に敷鉄板を設置し たこと等による工事費の増 ・使用する鋼材の調達期間に日 数を要したことによる工期の延 伸
道路企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(古 海1号橋)耐震補強工事 (1工区)(補助橋補修)	鳥取市 古海	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	(当初契約額) 151,360,000円	令和6年8月26日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月26日	-
					(変更後工期) 令和7年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月7日	現地調査に伴い取付金物の形 状変更等が必要となったため、 その検討に日数を要したことによ る工期の延伸
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道倉吉東伯線外道路 維持工事(倉吉西工区) (維持修繕)	倉吉市 西倉吉町外	オグラ建設株式会社 代表取締役 小椋 知章	(当初契約額) 55,000,000円	令和6年4月5日 ～ 令和7年3月25日	(当初契約年月日) 令和6年4月5日	-
				(第1回変更後契約額) 156,424,400円 (変更額) 〔 101,424,400円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月21日	担当路線を追加したこと等によ る工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道羽合東伯線外道路 維持工事(湯梨浜・北栄 工区)(維持修繕)	東伯郡 北栄町 松神外	有限会社若建設工業 代表取締役 若原 麻記	(当初契約額) 54,780,000円	令和6年4月5日 ～ 令和7年3月25日	(当初契約年月日) 令和6年4月5日	-
				(第1回変更後契約額) 116,118,200円 (変更額) 〔 61,338,200円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月24日	担当路線を追加したこと等による工事費の増
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道倉吉江府溝口線外 道路維持工事(倉吉南工 区)(維持修繕)	倉吉市 関金町 明高外	福井土建株式会社 代表取締役 福井 重秋	(当初契約額) 54,560,000円	令和6年4月9日 ～ 令和7年3月25日	(当初契約年月日) 令和6年4月9日	-
				(第1回変更後契約額) 102,399,000円 (変更額) 〔 47,839,000円 〕	(変更後工期) 令和7年5月16日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月24日	・担当路線を追加したこと等による工事費の増 ・道路上で発生した動物の死骸 処理等の緊急対応を指示したことによる工期の延伸
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	町道劬上野線(岩船大 橋)外耐震補強工事	東伯郡 琴浦町 八橋外	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	(当初契約額) 122,980,000円	令和7年2月26日 ～ 令和7年11月17日	(当初契約年月日) 令和7年2月26日	-
				(第1回変更後契約額) 123,762,100円 (変更額) 〔 782,100円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月17日	岩船大橋工区の工事用道路等は流用土を見込んでいたが、流用元の土質が悪く流用元を変更する必要が生じたことから運搬距離が伸びたことによる工事費の増
道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	県道岩屋谷米子線(新青 木橋)橋梁塗装工事(4工 区)(補助)	米子市 青木	有限会社小倉興産 代表取締役 小倉 将利	(当初契約額) 91,850,000円	令和6年9月25日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月24日	-
				(第1回変更後契約額) 103,369,200円 (変更額) 〔 11,519,200円 〕	(変更後工期) 令和7年6月13日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	・環境対策資材数量を見直し数量が増となったこと等による工事費の増 ・施工数量の増、剥離剤の養生時間を増やしたことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(高住～良田工区)改良工事(11工区)(交付金改良)	鳥取市 良田	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	(当初契約額) 120,670,000円	令和6年3月29日 ～ 令和6年12月25日	(当初契約年月日) 令和6年3月29日	-
					(変更後工期) 令和7年3月14日	(第1回変更契約年月日) 令和6年12月20日	関係機関との調整による工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 130,301,600円 (変更額) 〔 9,631,600円 〕	(変更後工期) 令和7年3月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月7日	擦り付けの舗装施工面積が増えたことによる工事費の増及び工期の延伸
道路建設課 〔八頭県土整備事務所〕	県道麻生国府線(福地工区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正)	八頭郡 八頭町 福地	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 92,840,000円	令和7年3月24日 ～ 令和7年12月3日	(当初契約年月日) 令和7年3月24日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和7年3月25日	年度別支出金額の変更
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(1工区)(補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一郎	(当初契約額) 104,170,000円	令和6年8月30日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月30日	-
				(第1回変更後契約額) 128,487,700円 (変更額) 〔 24,317,700円 〕	(変更後工期) 令和7年8月29日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月5日	隣接工区との調整により、工事区間を追加したことによる工事費の増及び工期の延伸
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(2工区)(補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社クラエー 代表取締役 西村 博文	(当初契約額) 96,580,000円	令和6年9月24日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月24日	-
					(変更後工期) 令和7年5月9日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月5日	施工箇所の湧水処理に期間を要したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(倉吉関金道路)改良工事(福山工区) (45工区)(補助改良)	倉吉市 福山	株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央	(当初契約額) 108,460,000円	令和6年1月10日 ～ 令和6年9月30日	(当初契約年月日) 令和5年12月19日	-
				(第1回変更後契約額) 118,303,900円 (変更額) 〔 9,843,900円 〕	(変更後工期) 令和7年3月14日	(第1回変更契約年月日) 令和6年9月27日	・舗装工事にICT施工を活用したこと等による工事費の増 ・関連工事との調整による工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 149,066,500円 (変更額) 〔 30,762,600円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和7年3月14日	現道の交通安全対策を追加したことによる工事費の増
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道倉吉由良線(和田～大谷茶屋工区)改良工事 (10工区)(ゼロ県債)	倉吉市 和田 ～ 大谷茶屋	株式会社クラエー 代表取締役 西村 博文	(当初契約額) 96,690,000円	令和6年2月16日 ～ 令和6年11月1日	(当初契約年月日) 令和6年1月26日	-
					(変更後工期) 令和7年2月20日	(第1回変更契約年月日) 令和6年10月30日	関連工事との調整による工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 113,949,000円 (変更額) 〔 17,259,000円 〕	(変更後工期) 令和7年3月14日	(第2回変更契約年月日) 令和7年2月20日	当初想定より地盤が軟弱であったため、その対策に伴う工事費の増及び工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 120,301,500円 (変更額) 〔 6,352,500円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和7年3月14日	ICT活用による工事費の増
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(北条倉吉道路延伸)橋梁下部工事 (A2橋台)(補助改良) (国補正)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 178,750,000円	令和6年5月10日 ～ 令和7年3月24日	(当初契約年月日) 令和6年1月23日	-
				(第1回変更後契約額) 244,928,200円 (変更額) 〔 66,178,200円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月21日	関連工区との調整により、土留擁壁を先行して行う必要が生じたこと等による工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(北条倉吉道 路延伸)改良工事(3工 区)(補助改良)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 93,940,000円	令和7年1月20日 ～ 令和7年9月30日	(当初契約年月日) 令和7年1月20日	-
				(第1回変更後契約額) 94,915,700円 (変更額) 〔 975,700円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月24日	北栄町との調整により、県の施 工範囲を変更したことによる工 事費の増
河川課 〔鳥取県土 整備事務所〕	佐治川ダム堰堤改良工 事(利水放流設備改良) (国補正)	鳥取市 佐治町 尾際	株式会社大和エンジニアリ ング 代表取締役 後藤 浩美	(当初契約額) 190,630,000円	令和5年3月31日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和5年3月31日	-
				(第1回変更後契約額) 199,795,200円 (変更額) 〔 9,165,200円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月10日	ゲート仕切弁の規格を現行基準 を満たすよう設計変更したこと等 による工事費の増
河川課 〔鳥取県土 整備事務所〕	塩見川広域河川改修工 事(10工区)	鳥取市 福部町 細川	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	(当初契約額) 182,710,000円	令和6年6月27日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年6月27日	-
				(第1回変更後契約額) 204,193,000円 (変更額) 〔 21,483,000円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月7日	地盤改良工について、事業進捗 を図るため、施工数量を増加し たこと等による工事費の増
河川課 〔鳥取県土 整備事務所〕	日置川河川改修工事(11 工区)	鳥取市 青谷町 青谷	YAHATA株式会社 代表取締役 中山 忠雄	(当初契約額) 139,370,000円	令和6年10月1日 ～ 令和7年3月21日	(当初契約年月日) 令和6年10月1日	-
				(第1回変更後契約額) 184,109,200円 (変更額) 〔 44,739,200円 〕	(変更後工期) 令和7年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月21日	・室内配合試験結果より、固化 材添加量を変更したこと等によ る工事費の増 ・JR近接施工に伴い、JRとの調 整に不測の日数を要したことによ る工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
河川課 〔 鳥取県土整備事務所 〕	日置川河川改修工事(10工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社原田建設 代表取締役 原田 實	(当初契約額) 95,920,000円	令和6年3月6日 ～ 令和6年10月31日	(当初契約年月日) 令和6年3月6日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和6年4月10日	契約約款の改正に伴う変更
				(第2回変更後契約額) 101,037,200円 (変更額) 〔 5,117,200円 〕	(変更後工期) 令和7年3月14日	(第2回変更契約年月日) 令和6年10月30日	事業の進捗を図るため、施工区間を延伸したことによる工事費の増及び工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 103,737,700円 (変更額) 〔 2,700,500円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和7年3月14日	河川水位の状況から、大型土のうによる仮締切を設置したこと等による工事費の増
河川課 〔 鳥取県土整備事務所 〕	浜村川河川改修工事(護岸工3工区)	鳥取市 鹿野町 岡木	株式会社創美 代表取締役 田村 徹	(当初契約額) 111,100,000円	令和6年8月7日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月7日	-
				(第1回変更後契約額) 117,114,800円 (変更額) 〔 6,014,800円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年2月27日	含水比の高い掘削残土が発生し、処分に当たって石灰改良を行ったことによる工事費の増
					(変更後工期) 令和7年5月30日	(第2回変更契約年月日) 令和7年3月14日	ブロック積擁壁資材の納入遅延に伴い、護岸工の着手時期が遅延したことによる工期の延伸
河川課 〔 八頭県土整備事務所 〕	八東川河川改修工事(大隼橋下部工)(交付金)	八頭郡 八頭町 市谷 ～ 福井	山陰建設株式会社 代表取締役 上田 正人	(当初契約額) 118,800,000円	令和6年11月6日 ～ 令和7年7月30日	(当初契約年月日) 令和6年11月6日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	完成部分の引渡しに伴う既完成部分の一部内容の変更

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
河川課 〔八頭県土 整備事務所〕	私都川(麻生工区)河川 災害関連工事(5年災241 号)(1工区)	八頭郡 八頭町 麻生	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 100,320,000円	令和6年10月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年10月9日	-
				(第1回変更後契約額) 117,302,900円 (変更額) 〔 16,982,900円〕	(変更後工期) 令和7年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	・県内産資材(大型ブロック)の 入手難による県外産資材への 変更に伴う工事費の増 ・資材・作業人員確保に不測の 日数を要したことによる工期の 延伸
河川課 〔八頭県土 整備事務所〕	私都川(延命寺工区)河川 災害関連工事(5年災 232号)(3工区)	八頭郡 八頭町 別府	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 106,480,000円	令和6年10月7日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年10月7日	-
					(変更後工期) 令和7年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月12日	資材・作業人員確保に不測の日 数を要したことによる工期の延 伸
河川課 〔八頭県土 整備事務所〕	私都川(麻生工区)河川 災害関連工事(5年災243 号及び244号)(2工区)	八頭郡 八頭町 麻生	株式会社八田建設 代表取締役 八田 大輔	(当初契約額) 95,040,000円	令和6年10月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年10月9日	-
					(変更後工期) 令和7年8月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	資材・作業人員確保に不測の日 数を要したことによる工期の延 伸
河川課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	東郷ダムメンテナンス工 事(選択取水設備更新)	東伯郡 湯梨浜町 別所	豊国工業株式会社 中四国支店 支店長 米川 博之	(当初契約額) 104,500,000円	令和5年6月26日 ～ 令和6年3月22日	(当初契約年月日) 令和5年6月26日	-
					(変更後工期) 令和7年3月14日	(第1回変更契約年月日) 令和6年1月23日	半導体不足により、機器の調達 に日数を要したことによる工期 の延伸
				(第2回変更後契約額) 106,436,000円 (変更額) 〔 1,936,000円〕		(第2回変更契約年月日) 令和7年3月13日	現地精査の結果、既設トランス の移設が必要となったこと等 による工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 〔 鳥取県土整備事務所 〕	見生寺谷川砂防工事(堰堤工)	鳥取市青谷町紙屋	吾妻商事株式会社 代表取締役 山本 明英	(当初契約額) 86,240,000円	令和5年8月29日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年8月29日	-
					(変更後工期) 令和6年7月31日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月14日	掘削後に法面崩壊が発生したため、対応方法の検討に期間を要することによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 133,262,800円 (変更額) 〔 47,022,800円 〕	(変更後工期) 令和6年12月20日	(第2回変更契約年月日) 令和6年6月14日	・法面崩壊の対応のため、追加の掘削が必要となったことによる工事費の増 ・追加掘削に伴う工期の延伸
					(変更後工期) 令和7年3月14日	(第3回変更契約年月日) 令和6年11月29日	法面崩壊対策として仮設モルタル吹付工を施工したことによる工期の延伸
				(第4回変更後契約額) 122,268,300円 (変更額) 〔 △10,994,500円 〕	(変更後工期) 令和7年3月25日	(第4回変更契約年月日) 令和7年3月12日	・法面の一部崩落に伴い、その対応に時間を要したしたことによる工期の延伸 ・堰堤工のコンクリート打設量を減少したこと等による工事費の減
				(第5回変更後契約額) 124,204,300円 (変更額) 〔 1,936,000円 〕		(第5回変更契約年月日) 令和7年3月24日	コンクリート価格変動により、設計単価を変更したことによる工事費の増
治山砂防課 〔 鳥取県土整備事務所 〕	北村地区災害関連緊急治山工事	鳥取市河原町北村	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	(当初契約額) 168,520,000円	令和6年9月11日 ～ 令和7年3月24日	(当初契約年月日) 令和6年9月11日	-
					(変更後工期) 令和8年1月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月21日	他工事との工事関係車両の通行調整に伴い、コンクリートの日当たり打設量を減少したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 〔 八頭県土 整備事務所 〕	福地谷川災害関連緊急 砂防工事	八頭郡 八頭町 福地	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 140,800,000円	令和6年5月28日 ～ 令和7年3月10日	(当初契約年月日) 令和6年5月28日	-
				(第1回変更後契約額) 168,576,100円 (変更額) 〔 27,776,100円 〕	(変更後工期) 令和7年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月10日	・伐木工の追加及び工事用道路 の一部が軟弱のため良質土へ 置き換えたことによる工事費の 増 ・災害復旧工事の集中により、 資材・ブロック工等の専門職種 の確保が困難であり、不測の日 数を要したことによる工期の延 伸
